



وزارة التعليم العالي وحدة إدارة المشروعات



مشروع تطوير التعليم العالي

الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير
مجلس إدارة الوحدة

www.heep.edu.eg

(نوفمبر 2005)



وزارة التعليم العالي وحدة إدارة المشروعات



تقرير المدير التنفيذي للوحدة عن الموقف التنفيذي والمالي لمشروعات التطوير

من أول يوليو 2005 حتى نهاية سبتمبر 2005



مشروع تطوير التعليم العالي

صندوق مشروع تطوير التعليم العالي HEEPF



الموقف التنفيذي للمشروع يتلخص فيما يلي:

- عدد المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا بالجامعات والكليات التكنولوجية المصرية من خلال أربع دورات 159 مشروعا (3 مشروعات للكليات التكنولوجية ومشروع لوزارة التعليم العالي)
- تنظيم 63 زيارة بالجامعات والمعاهد التكنولوجية المصرية
- مراجعة تقارير الدورات الثلاثة الاولى
- المشروعات التي تم الانتهاء منها وجرى تسليمها (5 مشروعات) البدء في إجراءات تسليم/تسلم المشروعات (9 دورة أولى + 6 دورة ثانية)
- استكمال التحويلات المالية لبدء تنفيذ مشروعات الدورة الرابعة (41 مشروع)
- أعمال المتابعة للمشروعات الجارى تنفيذها (159 مشروع)
- التنسيق بين المشروعات بغرض التكامل والاستفادة من أعمال التطوير
- عقد الاجتماع الثالث لفرق إدارة المشروعات الجارى تنفيذها (نوفمبر 2005)



صندوق مشروع تطوير التعليم العالي HEEPF الموقف المالي



■ إجمالي التحويلات المالية التي تم اعتمادها
حتى سبتمبر 2005 بالجنيه المصري:

13.608.900	■ الدورة الأولى
9.605.500	■ الدورة الثانية
5.326.000	■ الدورة الثالثة
5.475.000	■ الدورة الرابعة
34.015.400	الإجمالي



مشروع تطوير التعليم العالي

مشروع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICTP



يتناول المشروع خمس مشروعات فرعية كالتالي:

1. مشروع رفع البنية الأساسية لشبكات الجامعات

2. نظم المعلومات الإدارية المتكاملة

3. التعلم الإلكتروني

4. المكتبات الإلكترونية

5. التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات



مشروع تطوير التعليم العالي

مشروع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICTP



وزارة التعليم العالي

الموقف التنفيذي للمشروعات الخمس الفرعية يتلخص فيما يلي:

1. مشروع رفع البنية الأساسية لشبكات الجامعات

- علي المستوي المركزي: يتم تركيب الشبكة الموحدة بالتعاون مع وزارة الاتصالات والمعلومات
- علي مستوي الجامعات: يتم البت في اختيار أجهزة الربط بالشبكة ومن المتوقع الترسية خلال نوفمبر
- تم تخصيص مبلغ 9 مليون جنيه لتنفيذ هذا المشروع

2. نظم المعلومات الإدارية المتكاملة

- تم الانتهاء من دراسة ميكنة النظام الإداري بالمجلس الأعلى للجامعات تمهيدا لترحها
- تقوم حاليا بعض الجامعات بميكنة النظام الإداري ذاتيا أو من خلال شركات متخصصة أو من خلال استخدام برامج أعدتها جامعات أخرى

3. التعلم الإلكتروني

- تم توقيع عقد مع المجلس الأعلى للجامعات بمبلغ 6 و4 مليون جنيه لإنشاء أول مركز قومي للتعلم الإلكتروني وتم تعيين مديرة له

4. المكتبات الإلكترونية

- تم الاستعانة بأحد الخبراء الأجانب لتحديد الأولويات واختيار المكتبات الرقمية وجاري إجراءات التعاقد

5. التدريب في مجال تكنولوجيا المعلومات

- تم تخصيص مبلغ 16 و5 مليون جنيه للتدريب بالجامعات المصرية



مشروع تطوير التعليم العالي

مشروع تطوير كليات التربية

FOEP



الموقف التنفيذي للمشروع يتلخص فيما يلي:

- تم تزويد 26 كلية تربية بالمعامل والتجهيزات في مجالات التربية والعلوم واللغات بتكلفة إجمالية 25 و6 مليون دولار صرف منها حتى الآن حوالي 5 و3 مليون دولار للشركات الموردة
- تم الانتهاء من توصيف المقررات ومراجعتها وطباعتها وتوزيعها لعرضها علي الجامعات وكليات التربية بتكلفة إجمالية 2،5 مليون دولار
- تم إعداد اللائحة الداخلية لكليات التربية واعتمادها من اللجنة القومية ولجنة القطاع وتم عرضها علي المجلس الأعلى للجامعات للموافقة علي تنفيذها استطلاعيا بكليات التربية التي وافقت وأبدت استعدادها علي ذلك
- تم صدور القرارات الوزارية اللازمة للبدء في تطبيق اللائحة الداخلية الجديدة في أربع كليات تربية اعتبارا من العام الجامعي الحالي 2004-2005 وباري حاليا إعداد اللوائح الداخلية لباقي كليات التربية تمهيدا للبدء في تطبيقها اعتبارا من العام الجامعي القادم 2006-2007
- يتم حاليا اتخاذ إجراءات تقويم التطبيق الاستطلاعي في كليات التربية



مشروع تطوير التعليم العالي

مشروع تطوير كليات التربية

FOEP




تابع الموقف التنفيذي للمشروع يتلخص فيما يلي:

- يتم حاليا توريد البرامج التعليمية والتجارب المعملية (علوم) Software لكليات التربية بتكلفة إجمالية 240 ألف دولار
- يتم حاليا الانتهاء من إجراءات توفير ثلاث معامل علوم (كيمياء، فيزياء، بيولوجي) بتكلفة إجمالية 2و4 مليون دولار، يدفع 1و8 مليون دولار من القرض وما يعادل 0،6 مليون دولار من المكون المحلي، وتم البدء في اتخاذ إجراءات الشراء بالكليات التي تطبق بها الدراسة الاستطلاعية (أربع كليات) ثم يتبعها الكليات التي تطور لوائحها الداخلية بعد ذلك
- يتم حاليا تنفيذ برامج التنمية المهنية لأعضاء هيئة التدريس بكليات التربية بتكلفة إجمالية مليون دولار تم تحويل مبلغ 210 ألف دولار منها إلي كليات التربية
- يتم حاليا تنفيذ برنامج التطوير الذاتي لكليات التربية من الداخل College-Based Reform Projects من خلال تنفيذ المشروعات التي تقدمت بها كليات التربية، وتم اختيار 54 مشروعا منها بإجمالي تمويل 2و7 مليون دولار، وقد تم التعاقد علي هذه المشروعات وجاري تحويل الدفعة الأولى طبقا للتعاقد
- يتم في غالبية كليات التربية تنفيذ مشروعات ضمان الجودة والاعتماد لإعداد نظام داخلي للجودة وإعداد دراسة التقييم الذاتي للأداء بتكلفة إجمالية 465 ألف دولار



مشروع تطوير التعليم العالي

مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات FLDP



وزارة التعليم العالي

الموقف التنفيذي للمشروع يتلخص فيما يلي:

- تزويد الجامعات وفروعها بمعدات مراكز تدريب بتكلفة إجمالية حوالى 6 مليون جنيه
- تنفيذ خمس ورش عمل مركزية (2 ورشة عمل لمدربي المدربين، ورشة عمل عن تقييم البرامج والمقررات الدراسية، ورشة عمل عن القيادة الإستراتيجية بالجامعات، وورشة عمل تقييم التدريب وأثر التدريب
- تنفيذ برامج التدريب للمرحلة الأولى لعدد 17094 متدرب والمرحلة الثانية لعدد 40721 متدرب
- الاستجابة لقرارات المجلس الأعلى للجامعات بخصوص البرامج الجديدة واعتماد المدربين واختيار المتدربين وأخذها في الاعتبار عند إعداد ضوابط تنفيذ المرحلة الثالثة للتدريب
- الانتهاء من إعداد البرنامج التدريبي "المهارات الإدارية" الذى تم إعداده إلكترونياً بصفة تجريبية تمهيداً لعرضه على الجامعات لتقييمه قبل العمل على تعميم التجربة



مشروع تطوير التعليم العالي

مصادر تمويل الدورات التدريبية لمشروع FLDP (تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات)



وزارة التعليم العالي

Activities	Start	Finish	Training hour Cost (Project's contribution)	Training hour Cost (University's Contribution)
RFP 1 st Cycle	September 2004	February 2005	350	—
RFP 2 nd Cycle	March 2005	November 2005	200	—
RFP 3 rd Cycle	November 2005	March 2006	150	50
RFP 4 th Cycle	March 2006	September 2006	100	100
RFP 5 th Cycle	September 2006	March 2007	50	150
RFP 6 th Cycle	March 2007	September 2007	0	200



مشروع تطوير التعليم العالي

مشروع ضمان الجودة والاعتماد QAAP



الموقف التنفيذي للمشروع يتلخص فيما يلي:

- التعاقد مع عدد 107 مشروع من خلال الدورتين الأولى والثانية (على مستوى الجامعات والكليات التكنولوجية ولجان القطاع)
- جرى إتمام إجراءات التعاقد مع حوالي عدد 60 مشروع من خلال الدورة الثالثة
- تم عمل 55 زيارة لمتابعة مشروعات إنشاء نظام داخلي للجودة بالكليات على مستوى الجامعات
- استكمال التحويلات المالية لمشروعات الدورة الأولى وتحويل دفعة التعاقد لكافة مشروعات الدورة الثانية
- إتمام أربع زيارات ميدانية للتطوير بالمشاركة لأربع كليات انتهت من إعداد الدراسة الذاتية
- جرى الاستعداد لإتمام أربع زيارات ميدانية للتطوير بالمشاركة لأربع كليات أخرى انتهت من إعداد الدراسة الذاتية
- إعداد قاعدة بيانات بالنظر المراجعين لتغطية برنامج الزيارات الميدانية
- تحضير الكليات التي انتهت من الدراسة الذاتية للزيارات الميدانية الخاصة بالتطوير للمشاركة



مشروع تطوير التعليم العالي

مشروع الكليات التكنولوجية المصرية ETCP



- الانتهاء من كافة التشكيلات الخاصة بالهيكل التنظيمي للكليات التكنولوجية
- إعداد لائحة الكليات التكنولوجية ومراجعتها من قبل المستشار القانوني للأستاذ الدكتور الوزير تمهيداً لإصدارها
- تأهيل وتجهيز عدد 72 معمل حاسب وعدد 9 معامل لغة وتأهيل عدد 29 معمل انترنت وجاري تجهيزهم
- استكمال تأهيل وتجهيز عدد 5 معمل حاسب وعدد 3 معامل لغة إضافية وهذا قيد الدراسة طبقاً للموارد المتاحة
- إعداد المواصفات الخاصة بالمباني والورش والمدرجات المطلوبة للكليات التكنولوجية النموذجية والإعداد لترحها بإجمالي تكلفة تقديرية قدرها 33 مليون جنيه
- مطلوب إمداد المعاهد الفنية الصناعية بعدد 834 مدرس نظري وعدد 76 مدرب (مدرس عملي)، والمعاهد الفنية التجارية بعدد 230، ومعاهد السياحة والفنادق بعدد 46 مدرس
- تطوير البرامج الدراسية في 26 شعبة تتضمن تفاصيل 440 مقرر بالتخصصات التجارية والصناعية والتخصصات المدنية والمعمارية وتخصصات الفندقية والسياحة والخدمة الاجتماعية
- شارك في لجان تطوير البرامج 278 متخصص من أساتذة الجامعات والاستشاريين باتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصري للغرف السياحية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بالإضافة إلى مدرسي المعاهد الفنية



مشروع تطوير التعليم العالي

مشروع الكليات التكنولوجية المصرية ETCP



:

- الانتهاء من طباعة عدد 15 مجلداً تحتوى على البرامج الدراسية وتفاصيل المقررات الخاصة بالتخصصات الصناعية - التجارية وتخصصات السياحة والفنادق والخدمة الاجتماعية وتم توزيعها على جميع الكليات التكنولوجية والمعاهد الفنية التابعة لها وعلي المستفيدين من مخرجات التطوير كل فيما يخصه
- تطبيق البرامج المطورة للتخصصات التجارية والخدمة الاجتماعية اعتباراً من العام الدراسي 2005/2004، وتطبيق البرامج المطورة للتخصصات الصناعية والتخصصات المدنية والمعمارية وتخصصات الفندقه والسياحة اعتباراً من العام الدراسي 2006/2005
- تطبيق البرامج المطورة للتخصصات التجارية والخدمة الاجتماعية اعتباراً من العام الدراسي 2005/2004
- تطبيق البرامج المطورة للتخصصات الصناعية والتخصصات المدنية والمعمارية وتخصصات الفندقه والسياحة اعتباراً من العام الدراسي 2006/2005
- رفع مذكرة للأستاذ الدكتور الوزير بتوصيات اللجنة المكلفة بدراسة إعداد الكتب الدراسية للكليات بحيث تتوافق مع المستويات العالمية
- تحديد وطرح مواصفات المعدات والأجهزة للمعامل والورش التي ستخدم البرامج المطورة في المعاهد الصناعية ومعاهد الفندقه والسياحة التابعة للكليات التكنولوجية النموذجية فى المطرية والمحلة وجنوب الوادى بموازنة تقديرية فى حدود 57 مليون جنيه



مشروع تطوير التعليم العالي

مشروع الكليات التكنولوجية المصرية ETCP



- :
- تدريب عدد 12 مدرب ورشة من خلال دورة تدريب المدربين والتي نظمها الصندوق الاجتماعي للتنمية والتي بموجبها سيحصلون على شهادة تدريب المدربين الدولية الفرنسية AFPA
 - تدريب عدد 623 مدرس بنسبة 75% من مدرسي النظري بالمعاهد الفنية على الحاسب ICDL
 - تدريب عدد 441 مدرس بنسبة 54% من مدرسي النظري بالمعاهد الفنية على اللغة الإنجليزية
 - تدريب عدد 267 مدرس بنسبة 85% من مدرسي العملي بالمعاهد الفنية تدريب تخصصي (ميكانيكا-كهرباء-مدنى وعمارة)
 - تدريب عدد 95 مدرس 100% من الفنيين بالمعاهد الفنية
 - تدريب عدد 446 بنسبة 32.4% من الإداريين بالكليات التكنولوجية
 - تدريب مدرسي النظرى بالمعاهد الفنية تدريب تخصصى طبقاً للبرامج الدراسية المطورة
 - تأهيل معامل الإنترنت بالكليات وطرح المناقصة الخاصة بتجهيز المعامل
 - سيتم تدريب العاملين بالكليات على استخدام معامل الإنترنت قبل توريد الأجهزة وتشغيل الشبكة
 - طرح المناقصة الخاصة بالتوأمة فى تخصصات ميكانيكا السيارات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والفندقه والسياحة بالكليات التكنولوجية النموذجية بالمطرية والمحلة وجنوب الوادى



مشروع تطوير التعليم العالي

التعريف بمشروعات التطوير والنشاط الإعلامي Awareness

يوليو 2002 – سبتمبر 2005



QAAP	ETCP	FOEP	FLDP	ICTP	HEEPF	المشروع النشاط
29	23	20 (25)	34	-	63	عدد الزيارات التي تمت بالجامعات للتعريف بالمشروع
1980	1515	700	2641	-	3400	عدد الحضور
11	9	4	38	-	4	عدد الأنشطة والبرامج الإعلامية عن المشروع
3	2	4	7	-	7	من خلال مطويات أو مطبوعات
1	-	-	1	1	1	من خلال بوابة الكترونية



مشروع تطوير التعليم العالي

الدورات التدريبية

يوليو 2002 – سبتمبر 2005



QAAP	ETCP	FOEP	FLDP	ICTP	HEEPF	المشروع النشاط
7	4	19	58	-	7	عدد الدورات التدريبية لإعداد المدربين
225	24	470	1390	-	840	عدد المتدربين
174	68	8	2394	-	10	عدد برامج التدريب بالجامعات
2933	1800	600	5781	-	610	عدد المتدربين



مشروع تطوير التعليم العالي

المشروعات المنفذة بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي يوليو 2002 – سبتمبر 2005



وزارة التعليم العالي

QAAP	ETCP	FOEP	FLDP	ICTP	HEEPF	المشروع / النشاط
113	4	8	25	16	159	عدد المشروعات الممولة
88	14	18	-	-	72	عدد الكليات الجامعية / المعاهد المتوسطة بالكليات التكنولوجية
18	-	8	25	16	2/15	عدد الجامعات / المؤسسات التعليمية
1766	60	-	3508	120	1830	عدد المشاركين في إدارة وتنفيذ المشروعات في الجامعات
-	1	72	2394	-	6	عدد البرامج



مشروع تطوير التعليم العالي

أعداد وتكاليف الخبراء المحليين والأجانب الذين تم الاستعانة بهم في مشروعات التطوير



وزارة التعليم العالي

QAAP	ETCP	FOEP	FLDP	ICTP	HEEPF	المشروع	النشاط
66	425	277	94	47	150	عدد الخبراء المحليين	
101,37	90,29	130,64	74,95	30,68	138,55	التكاليف بالألف دولار	
4	20	6	6	1	7	عدد الخبراء الأجانب	
5,13	منحة من DFID	13,98	بدون تكاليف	3,1	13,25	التكاليف بالألف دولار	



مشروع تطوير التعليم العالي

تقييم بعثة البنك الدولي لمشروعات التطوير اكتوبر 2004 + يونيو 2005



وزارة التعليم العالي

م	اسم المشروع	تقييم المشروع في اكتوبر 2004	تقييم المشروع في يونيو 2005
1	صندوق مشروع تطوير التعليم العالي	مرضى	مرضى
2	مشروع الكليات التكنولوجية المصرية	مرضى	مرضى
3	مشروع تطوير كليات التربية	غير مرضى	مرضى
4	مشروع تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات	مرضى	مرضى
5	مشروع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات	لم يتم التقييم	مرضى
6	مشروع ضمان الجودة والاعتماد	مرضى	مرضى



مشروع تطوير التعليم العالي

التمويل ومصادره المختلفة



م	المشروع	نوع التمويل	التمويل (بالمليون دولار)
1	HEEP	قرض مشروع تطوير التعليم العالي	50 (قرض) 10 (مكون محلي)
2	ETCP	منحة الخليج	0.5
3	FOEP (EEP)	قرض الهيئة الدولية للتنمية IDA - البنك الدولي	13
4	QAAP	منحة منظمة فورد	0.4




مشروع تطوير التعليم العالي

فئات ونسب الصرف من القرض



وزارة التعليم العالي

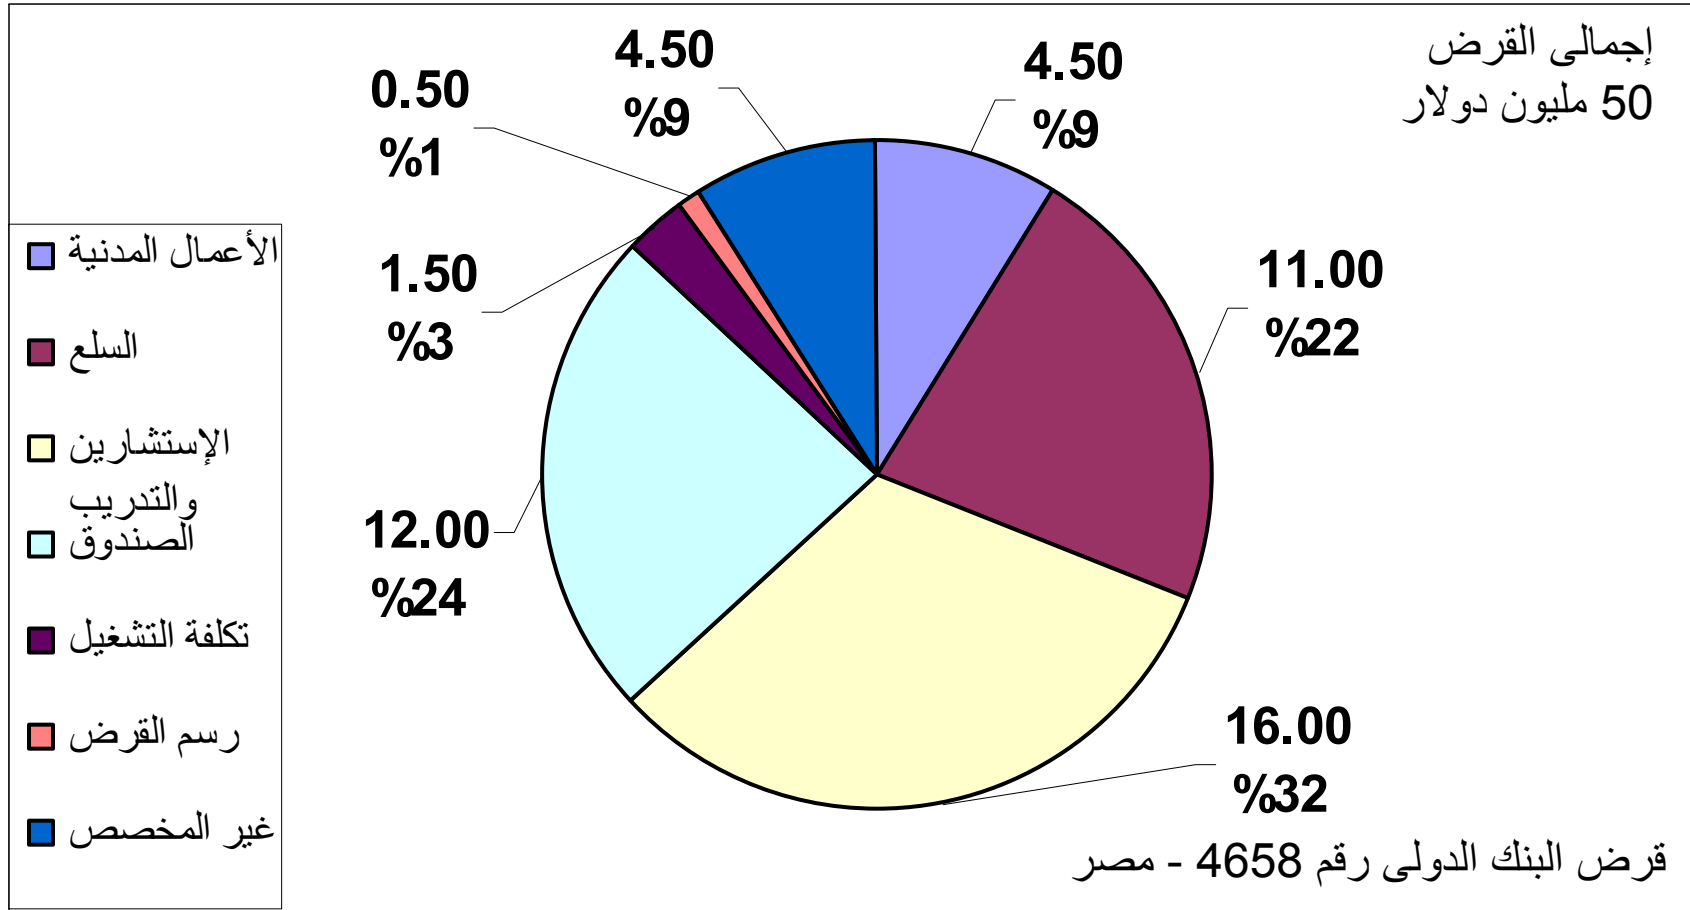




مشروع تطوير التعليم العالي

توزيع الموازنة على مشروعات التطوير

قرض IBRD رقم 4658- مصر



وزارة التعليم العالي

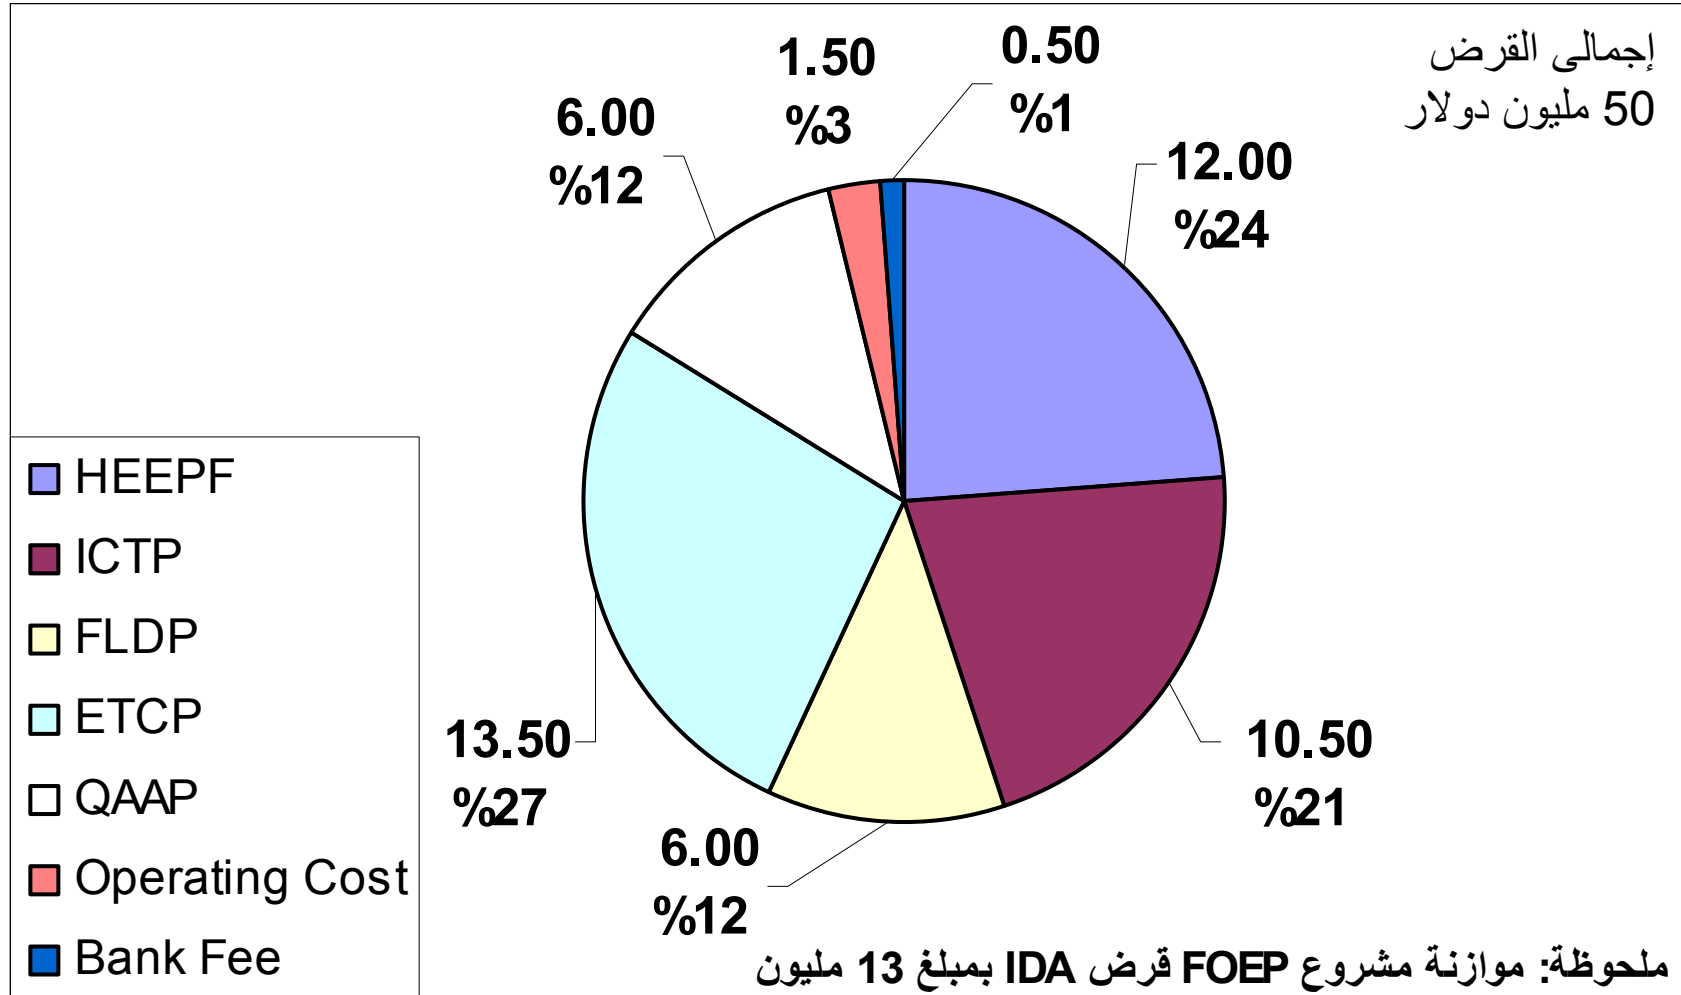




مشروع تطوير التعليم العالي

التمويل الإضافي المطلوب توفيره لمشروعات التطوير خلال المرحلة الاولى 2002 - 2007



وزارة التعليم العالي

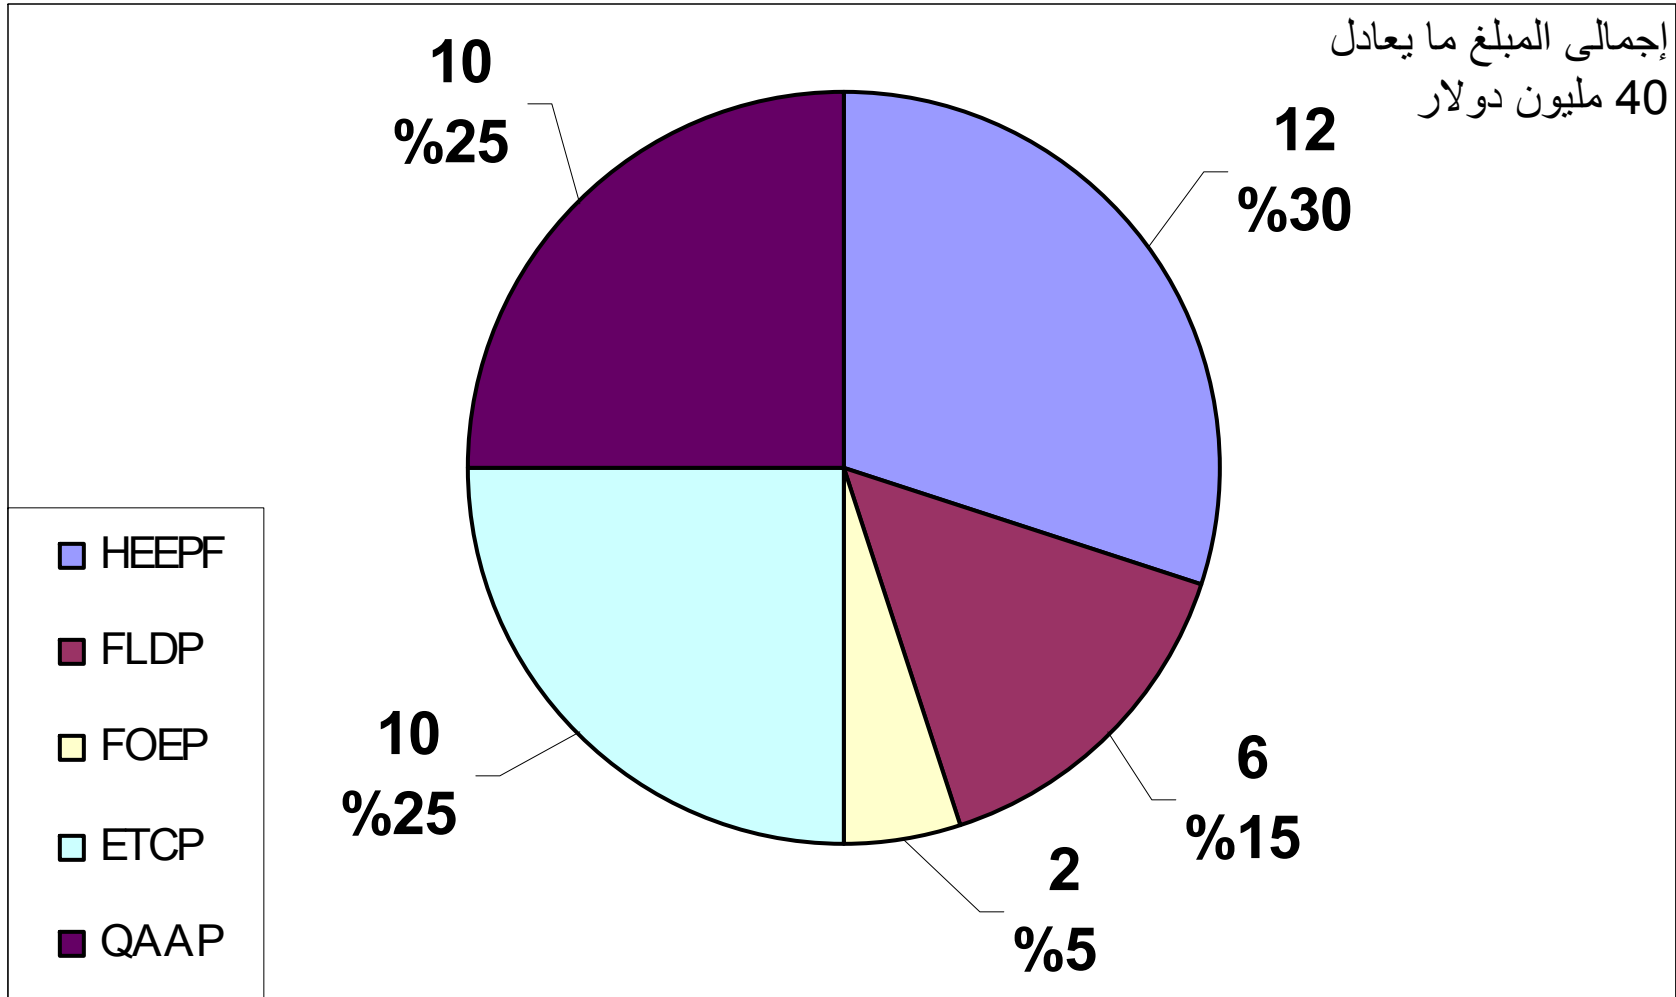



مشروع تطوير التعليم العالي

الموقف المالي لمشروعات التطوير

قرض البنك الدولي رقم 4658 - مصر
يوليو 2002 - سبتمبر 2005



وزارة التعليم العالي

						2005/9/30					
% 43.11	% 133.54	16.02	% 84.79	10.17	% 0.06	0.01	% 48.69	5.84	% 24.00	12.00	HEEPF
% 18.88	% 66.85	7.02	% 63.38	6.66	% 0.18	0.02	% 3.29	0.35	% 21.00	10.50	ICTP
% 8.79	% 54.45	3.27	% 12.53	0.75	% 0.27	0.02	% 41.65	2.50	% 12.00	6.00	FLDP
% 7.17	% 19.74	2.66	% 4.20	0.57	% 0.18	0.02	% 15.36	2.07	% 27.00	13.50	ETCP
% 8.51	% 52.74	3.16	% 32.43	1.95	% 0.13	0.01	% 20.18	1.21	% 12.00	6.00	QAAP
% 1.42	% 35.29	0.53	% 4.80	0.07	% 1.16	0.02	% 29.33	0.44	% 3.00	1.50	PMU
% 1.35		0.50							% 1.00	0.50	
		33.17		20.17		0.09		12.41		50.00	
% 10.76		4.00									
% 100.00		37.17							% 100.00	50.00	
		% 74.34		% 40.33		% 0.18		% 24.82			




مشروع تطوير التعليم العالي

المبالغ المنصرفة والغير منصرفة من القرض خلال الفترة يوليو 2002 - سبتمبر 2005



وزارة التعليم العالي

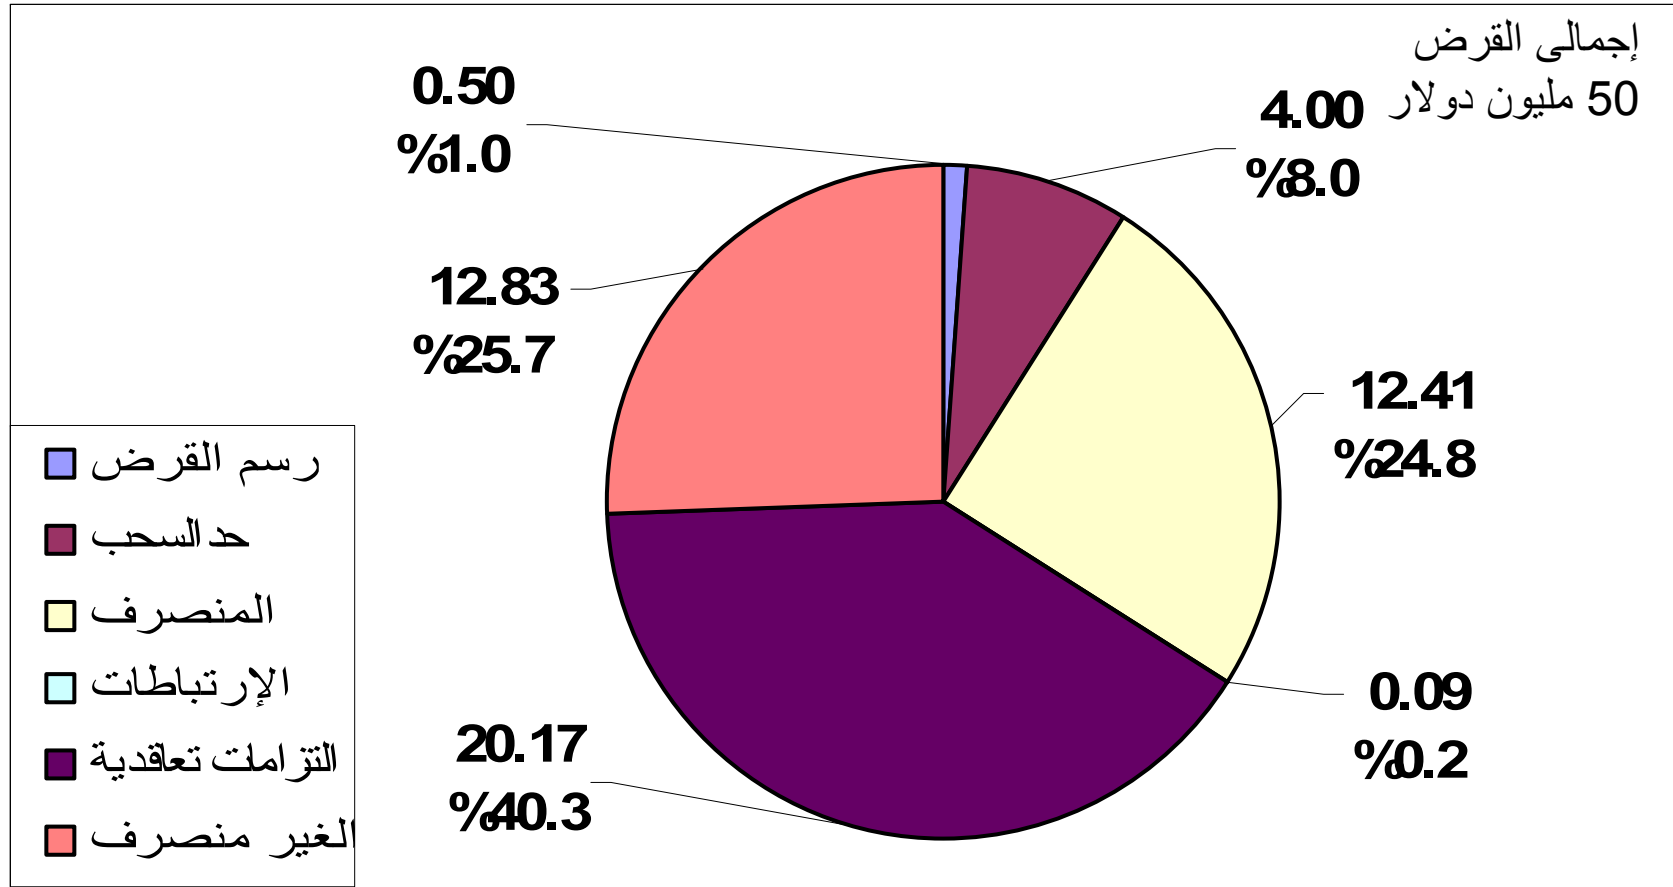

قرض البنك الدولي رقم 4658 - مصر




مشروع تطوير التعليم العالي

إجمالي المنصرف على المشروعات

خلال الفترة يوليو 2002 - سبتمبر 2005



وزارة التعليم العالي

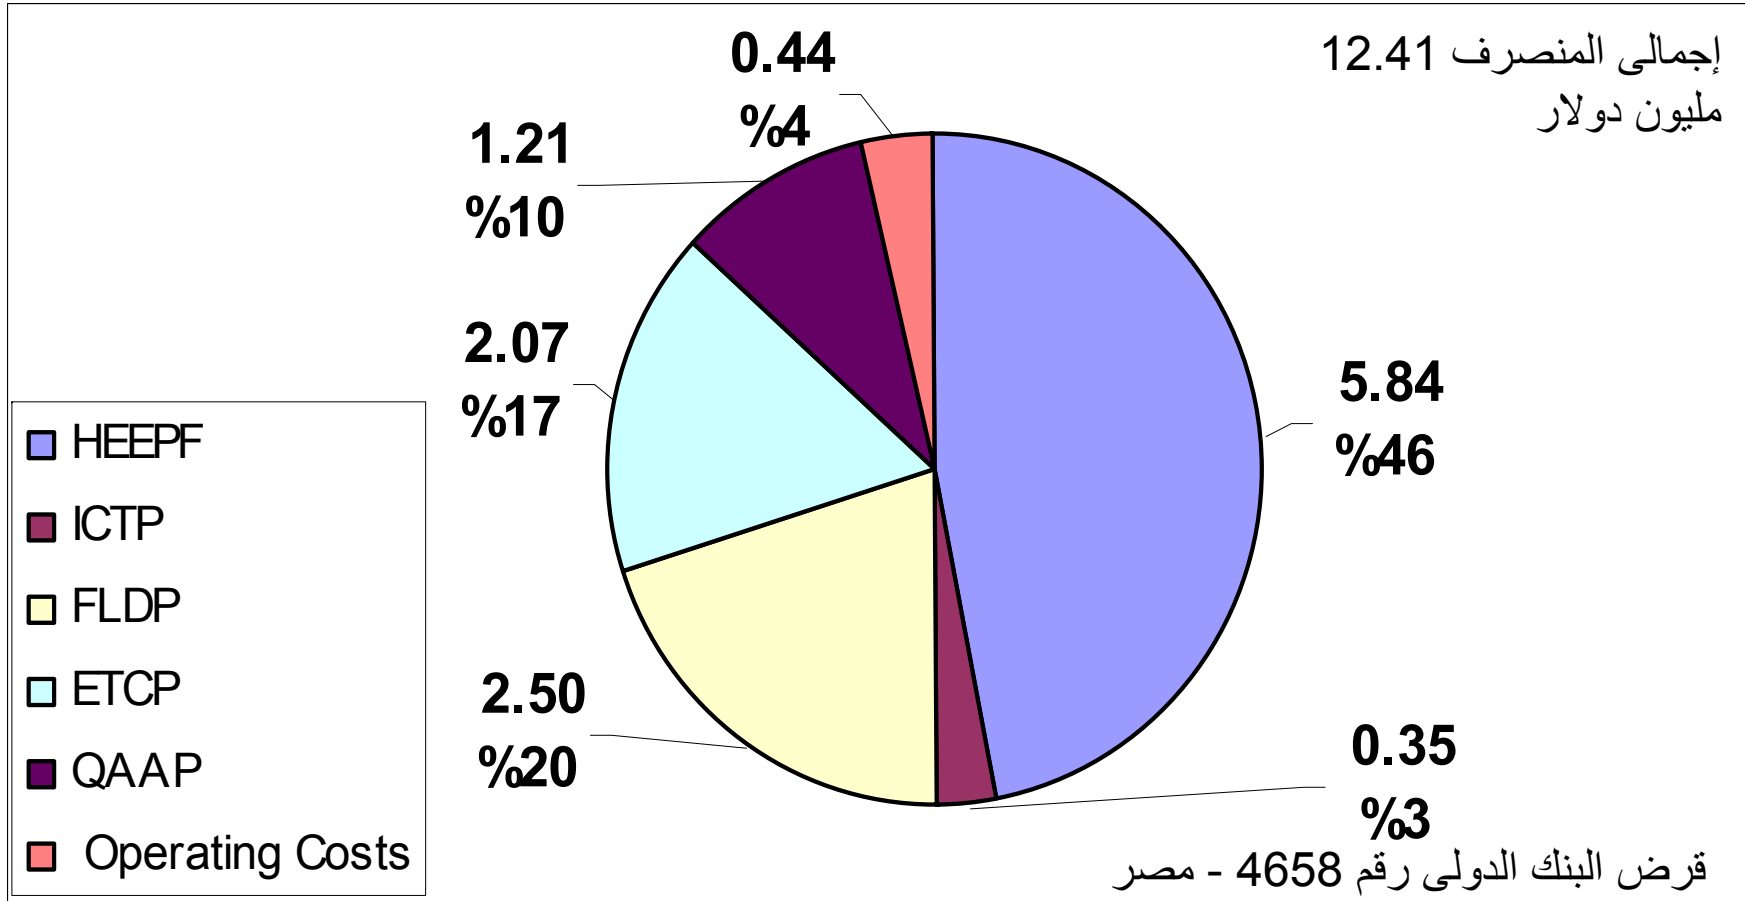




مشروع تطوير التعليم العالي

HEEP QUARTERLY & CUMULATIVE EXPENDITURES (July 2002 – September 2005)



وزارة التعليم العالي

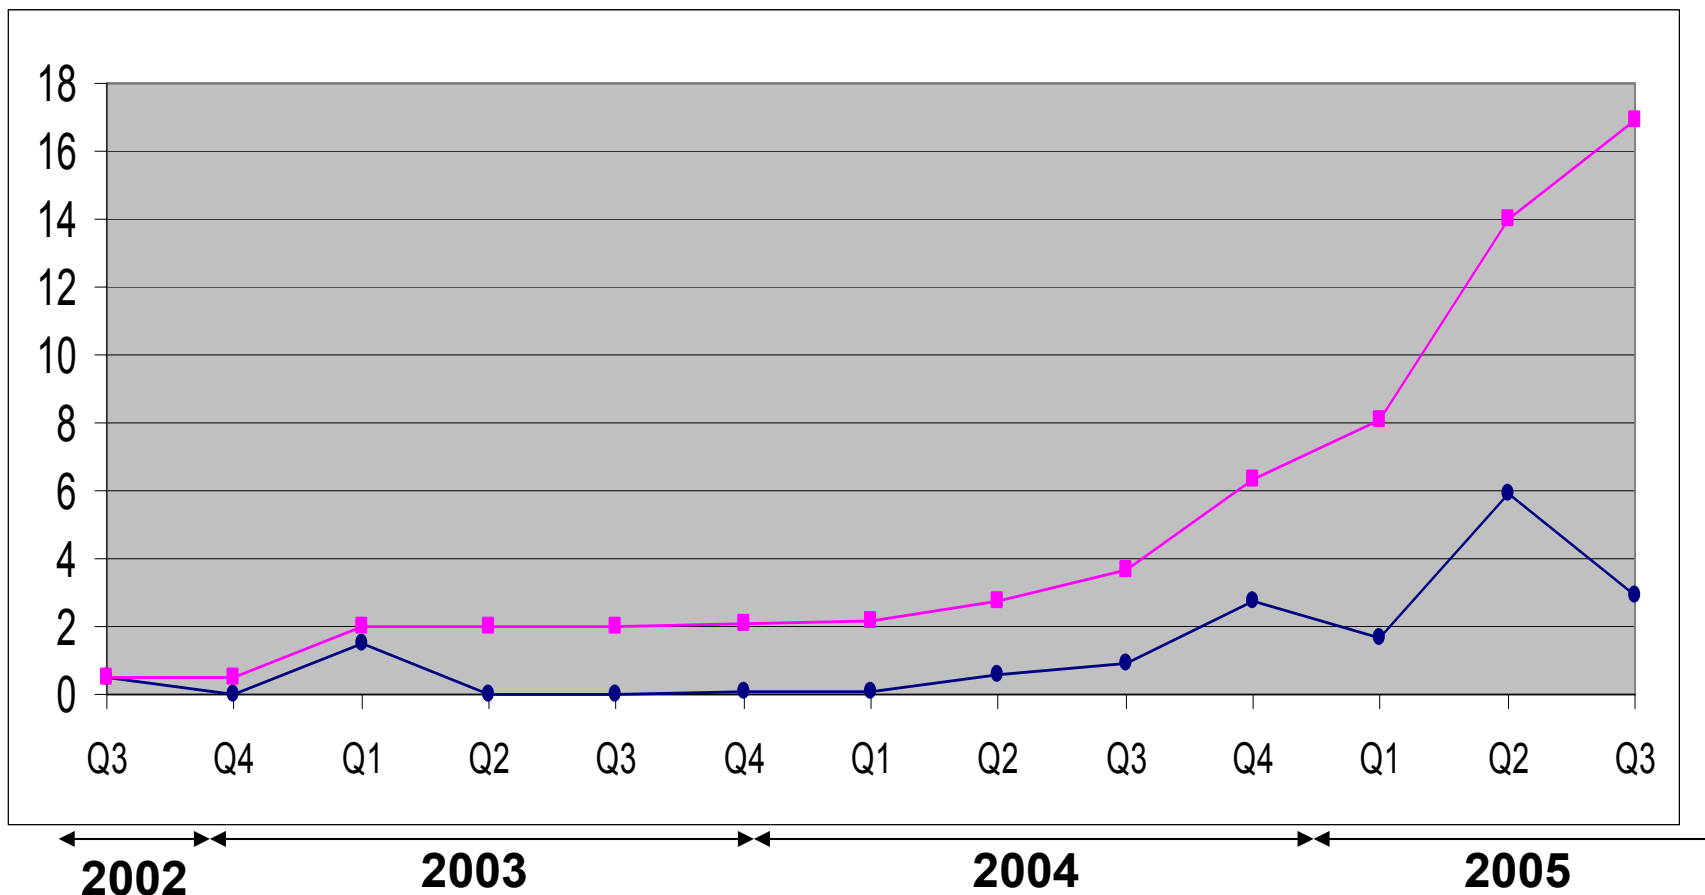

Disbursements	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3
Quarter ●	0.50	0.00	1.50	0.00	0.03	0.06	0.09	0.54	0.91	2.72	1.70	5.91	2.94
Cumulative ■	0.50	0.50	2.00	2.00	2.03	2.09	2.18	2.73	3.64	6.36	8.06	13.97	16.91




مشروع تطوير التعليم العالي

HEEP QUARTERLY & CUMULATIVE EXPENDITURES (July 2002 – September 2005)



وزارة التعليم العالي

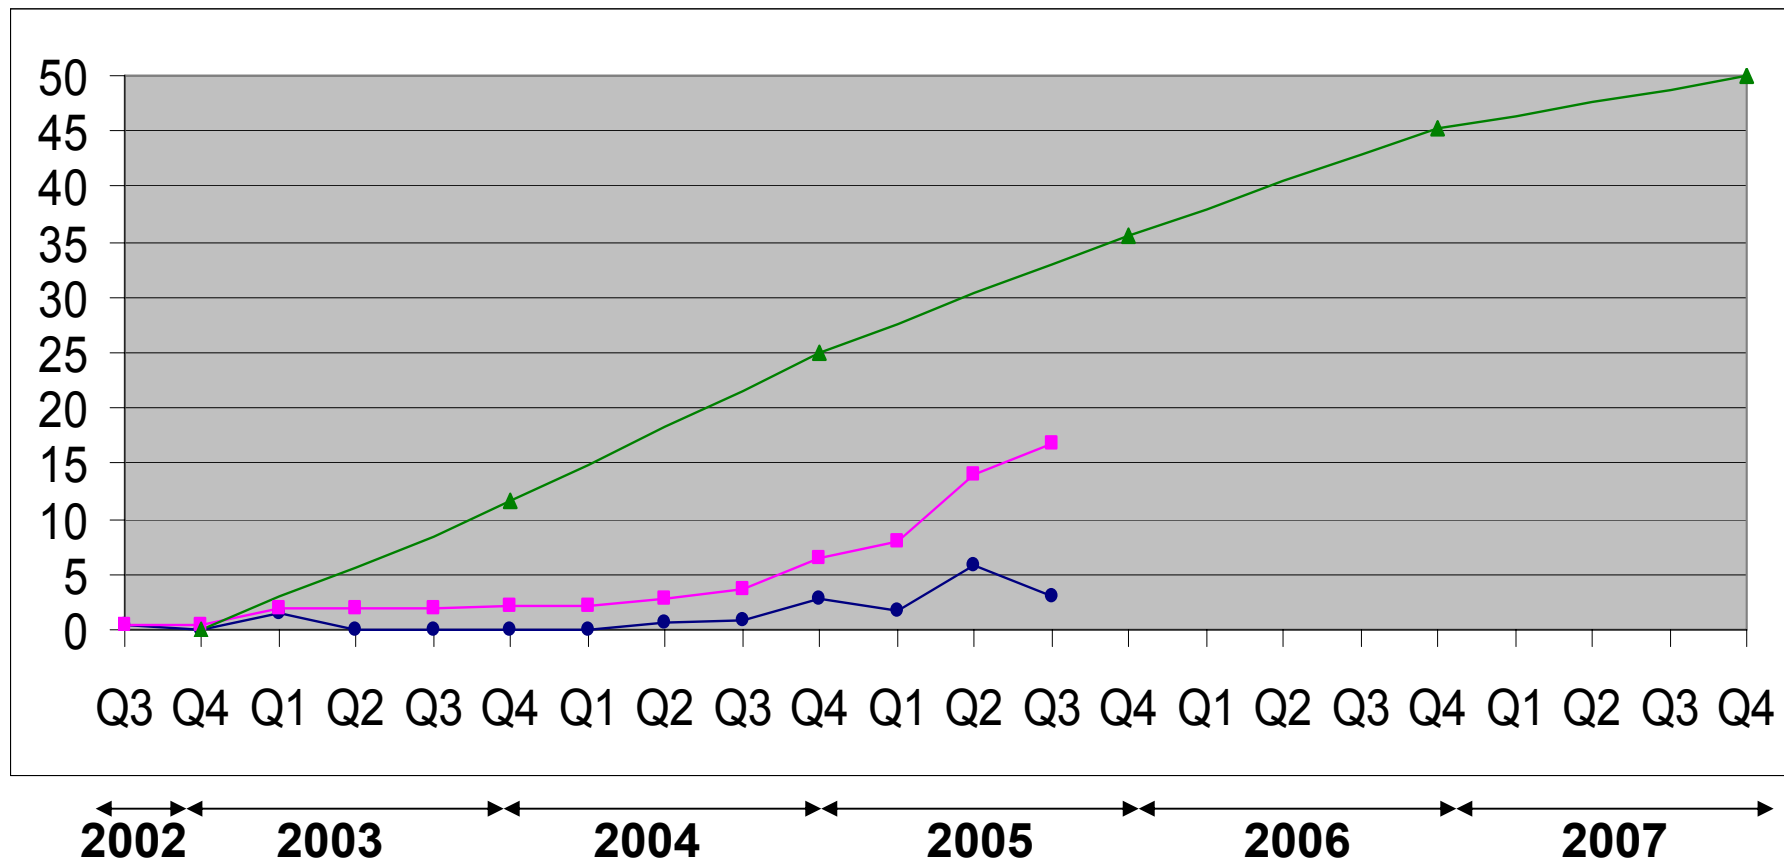

Actual Disbursements	Disbursements	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4	
	Quarter ●	0.50	0.00	1.50	0.00	0.03	0.06	0.09	0.54	0.91	2.72	1.70	5.91	2.94										
	Cumulative ■	0.36	0.50	2.00	2.00	2.03	2.09	2.18	2.73	3.64	6.36	8.06	13.97	16.91										
Estimated Disbursements (PAD) ▲		0.00					11.59				24.96				35.64				45.21				50.00	



مشروع تطوير التعليم العالي

الموقف المالي لمشروع FOEP



قرض هيئة التنمية الدولية IDA رقم N008-0
يوليو 2002 – سبتمبر 2005

						2005/9/30			
% 71.11	9.24	% 37.24	4.84	% 0.05	0.01	% 33.82	4.40	13.00	FOEP
% 6.92	0.90								
% 78.03	10.14								




مشروع تطوير التعليم العالي

المبالغ المنصرفة والغير منصرفة من القرض خلال الفترة يوليو 2002 - سبتمبر 2005



وزارة التعليم العالي

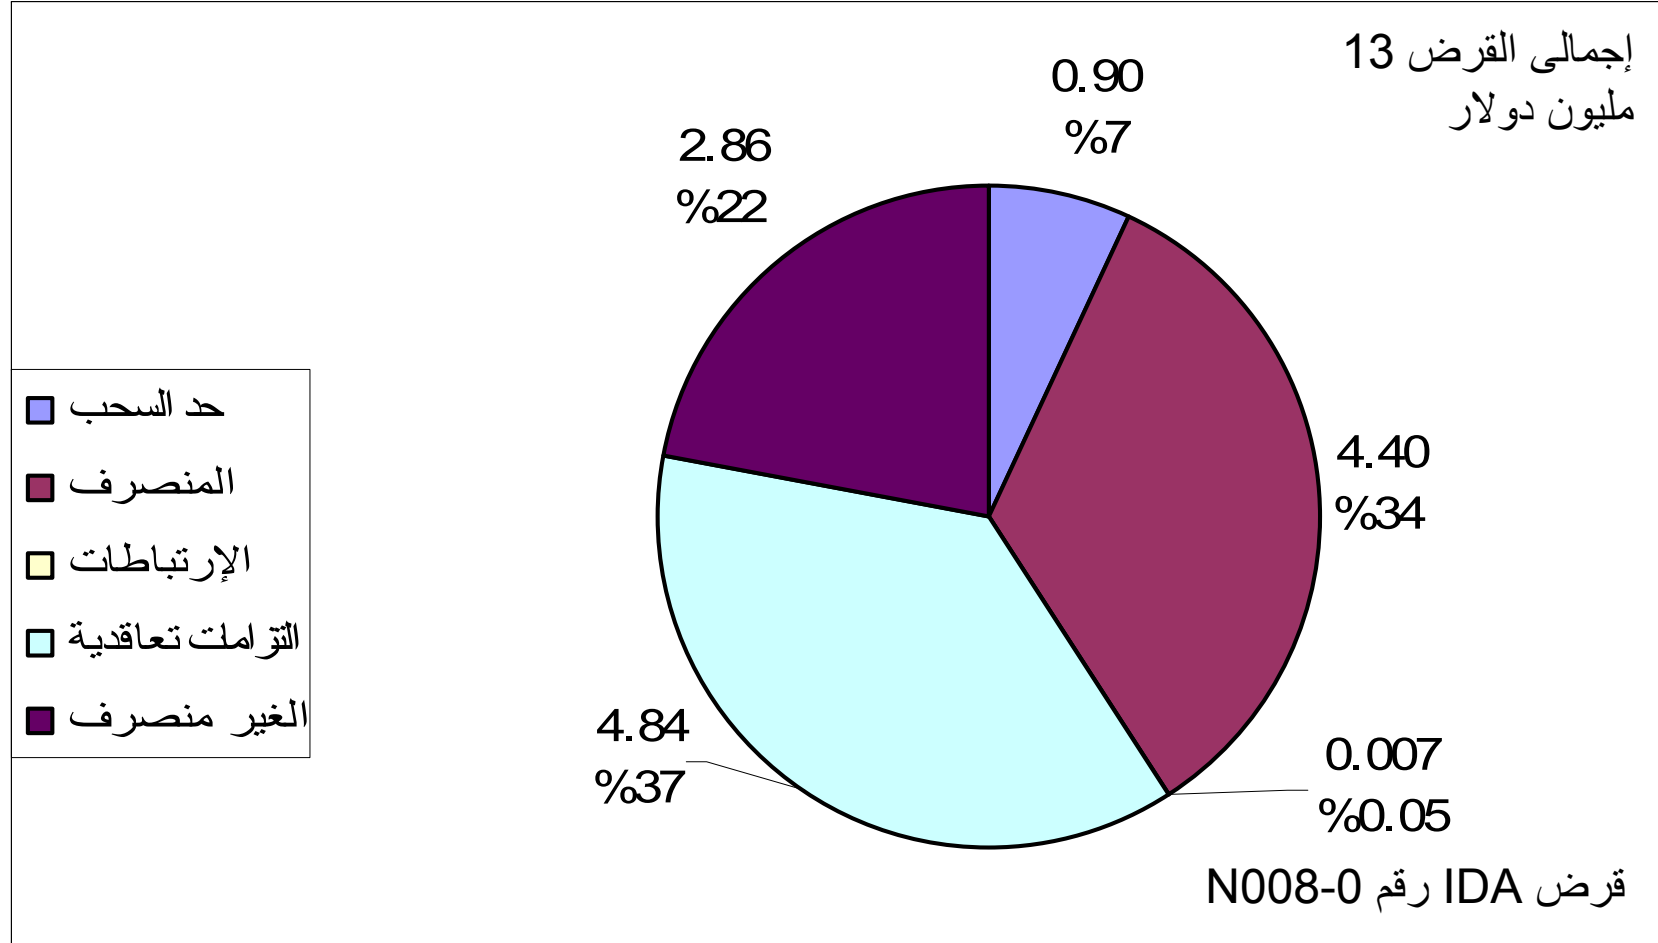



مشروع تطوير التعليم العالي

إجمالي المنصرف من القرض

خلال الفترة يوليو 2002 - سبتمبر 2005



وزارة التعليم العالي

